

總務處報告



- 我們致力於：
提供孩子和老師優質、安全的學習和教學空間。
- 報告人：總務主任 黃大昌



新孝悌樓新建工程 接續工程進度簡介




111年提報其他修 建工程項目簡介

新孝悌樓新建工程接續工程進度簡介

- 截至1/18(一)止，預定進度15.19%，實際進度15.53%，進度差異+0.34%。
- 已完成BS版灌漿工程，目前正進行B1F-1F牆模板組立，預計1/23(六)進行B1F-1F牆模灌漿工程。
- 新孝悌樓新建工程(第一階段)預計於111年3月14日完工(共630個日曆天)。
- 和美樓校舍拆除、景觀工程及聯絡走廊工程(第二階段)預計於112年3月14日完工(共210個日曆天)。



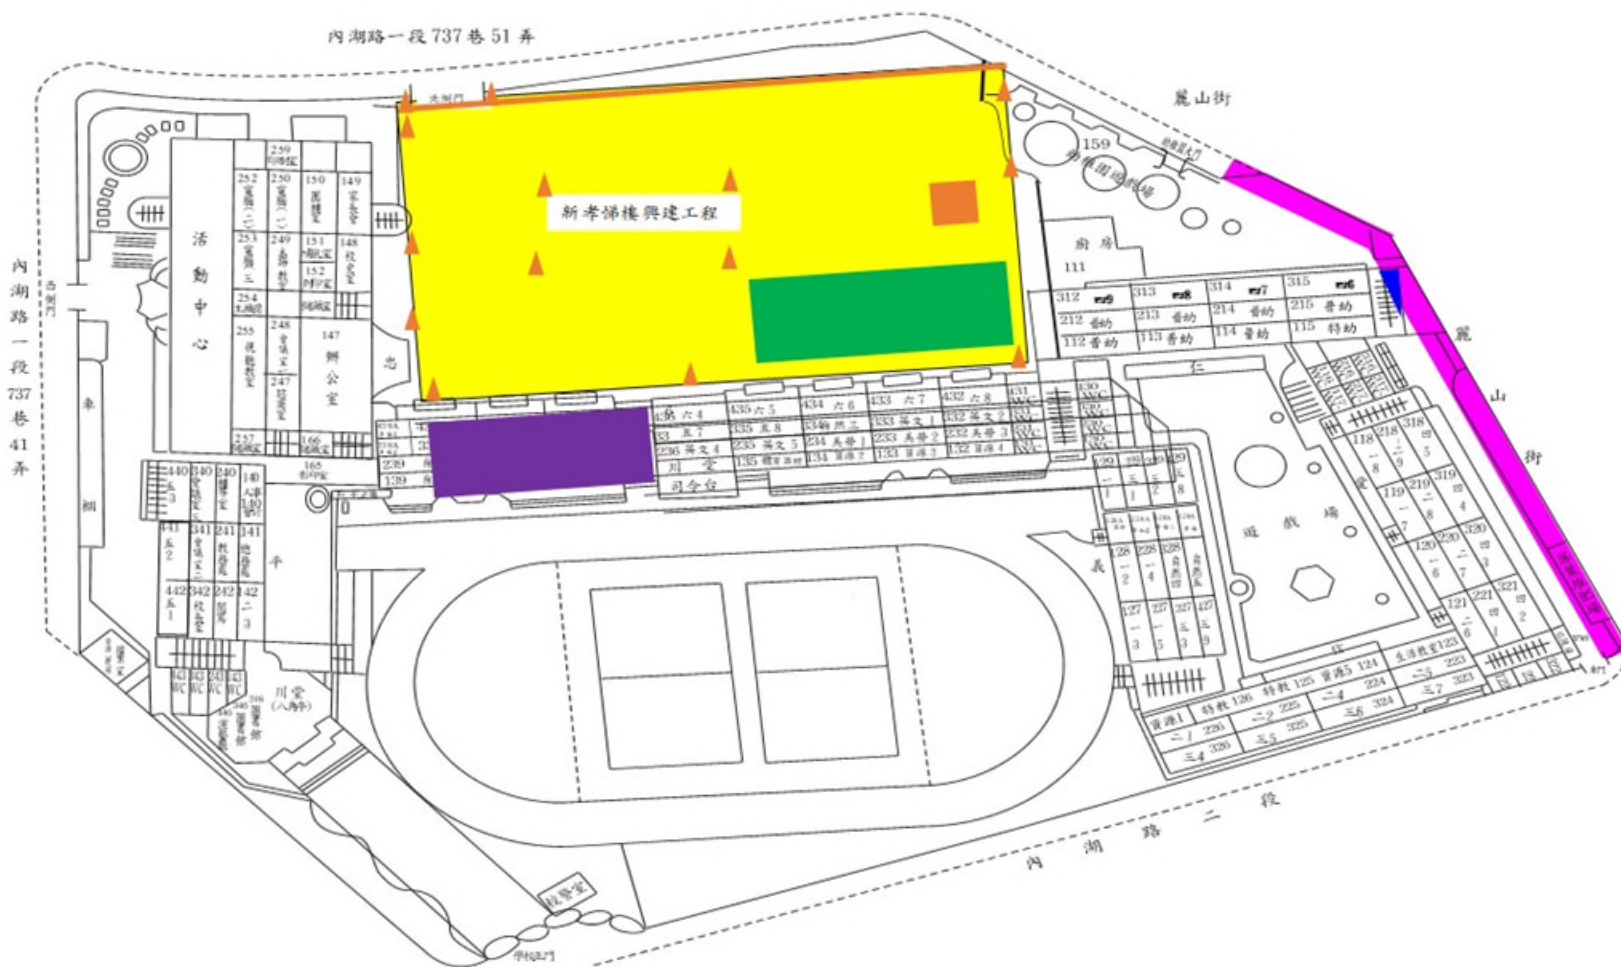



藍色

- 仁民樓樓梯部分拆除耐震能力詳細評估及補強工程
- 東側圍牆內縮3.64公尺
- 本案係新孝悌樓新建工程建照執照(108建字第0038號)附表注意事項第44項列管項目。





粉紅色

- 東側圍牆內縮改建工程
- 東側圍牆內縮3.64公尺
- 本案係新孝悌樓新建工程建照執照(108建字第0038號)附表注意事項第44項列管項目。





綠色

- 優質圖書館精進方案
- 本案亦為新孝悌樓興建工程調整工項之一，新孝悌樓圖書館1-2樓規劃作為圖說館使用，目前圖書館位於平靜樓2-3樓，俟新孝悌樓啟用後，將搬遷至新孝悌樓1樓及2樓提供更優質的服務。





紫色

- 遊戲場整修工程
- 本校兒童遊戲場目前僅一座磨石子旋轉溜滑梯，原和美樓校舍拆除後，原規劃為景觀工程，今欲利用部分綠地整建一座特色遊戲場。



橘色

- 新孝悌樓新建工程接續工程校園警監設備移機工程
- 配合本市校園網路高速化執行計畫規劃案，俟新孝悌樓啟用後，擬將原位於忠勤樓2樓之校園警監設備系統搬遷至新孝悌樓3樓，並復原已拆除之校園警監設備。





感謝聆聽
